


Anexo 10 Avance del Programa corregido al 12 de febrero

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	<b>Inicio</b>	100%														
2	Memorias y trámites ante SOAPAP (drenaje exterior)	100%														
3	Convenios con SOAPAP	100%														
4	Obras de DRENAJE POR CALLES (SOAPAP)	100%														
5	Calculo de Carga instalada y Demanda (memoria electrica)	100%														
6	Tramitología CFE	100%														
7	Pagos y Derechos	100%														
8	Obra de Infraestructura	100%														
9	Subestación provicional para obra y pruebas (infraestructura electrica)	100%														
10	<b>Instalación Electrica provicional OBRA (proceso)</b>	100%														
11	Estructura Metálica ( ver programa detallado)	100%														
12	Apriete Estructura Metálica															
13	Losa Acero (ver programa detallado)															
14	Concreto Losa Acero( ver programa detallado)															
15	Pretilos azoteas															
16	Bajadas Pluviales preparaciones															
17	Impermeabilización losas,entortados,enladrillados															
18	Asignar contrato y anticipo contratista hydr.y sanit.	100%														
19	Suministros materiales hidraulica y sanitaria	100%														
20	Bajadas pluviales tuberias y coladeras	100%														
21	Instalaciones Sanitarias/piso y registros	100%														
22	Instalaciones Hidraulicas/piso	100%														
23	Contratación y anticipo contratista electricidad	100%														
24	Suministro materiales electricos	100%														
25	Instalaciones Electricas/piso	100%														
26	Firmes pisos en general en FORO y AUDITORIO	100%														
27	Muros Interiores	100%														
28	Instalaciones Electricas/Muro	100%														
29	Instalaciones hidraulicas/Muro	100%														
30	Instalaciones sanitarias /Muro	100%														
31	Aplanados Muros	100%														
32	Recubrimientos Muros	100%														
33	Instalaciones eléctricas por Plafon	100%														
34	Instalaciones hidraulicas y sanitarias/plafón	100%														

Anexo 10 Avance del Programa corregido al 12 de febrero

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter		
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
35	<b>Muros,cadenas y castillos (fachada)</b>				100%											
36	Preparaciones para precolados (fachada)				100%											
37	Aplanados muros fachadas					100%										
38	Muro quebrado fachada principal				100%											
39	Azulejo Talavera fachadas					100%										
40	<b>Contratacion y anticipo de empresa (muros prefabricados fachada)</b>	100%														
41	Fabricación precolados		100%													
42	Montaje precolados						100%									
43	<b>Contratación y anticipo (mecanica teatral)</b>	100%														
44	Suministro materiales p/estructura (mecanica teatral)		100%													
45	Fabricacion estructuras p/mecanica teatral			100%												
46	Montaje Estructura Metalica Foro,puentes,contrapesos,poleas etc						100%									
47	Canalizaciones y Cableados (mecanica teatral)						100%									
48	Suministro equipos (mecanica teatral)			100%												
49	Carpinteria Pisos (mecanica teatral)							100%								
50	<b>Contratación y anticipo de contratista Aire Acondicionado</b>	100%														
51	Compra materiales (aire acondicionado)		100%													
52	Ductos inyección AA							100%								
53	Ductos Retorno AA							100%								
54	Ductos Extracción							100%								
55	Tuberias Agua Helada							100%								
56	Aislamientos en General								100%							
57	Suministro Manejadoras								100%							
58	Suministro Extractores								100%							
59	Suministro Generadores de Agua Helada								100%							
60	Montaje Manejadoras									100%						
61	Montaje extractores									100%						
62	Montaje Generadores Agua Helada									100%						
63	Automatización del Aire Acondicionado										100%					
64	<b>Plafones Acusticos y otros (acabados)</b>															
65	Plafones acabado espejo															
66	Luvers aluminio en plafones (acabados)															
67	Recubrimientos en muros															48%
68	Molduras en muros															32%

Anexo 10 Avance del Programa corregido al 12 de febrero

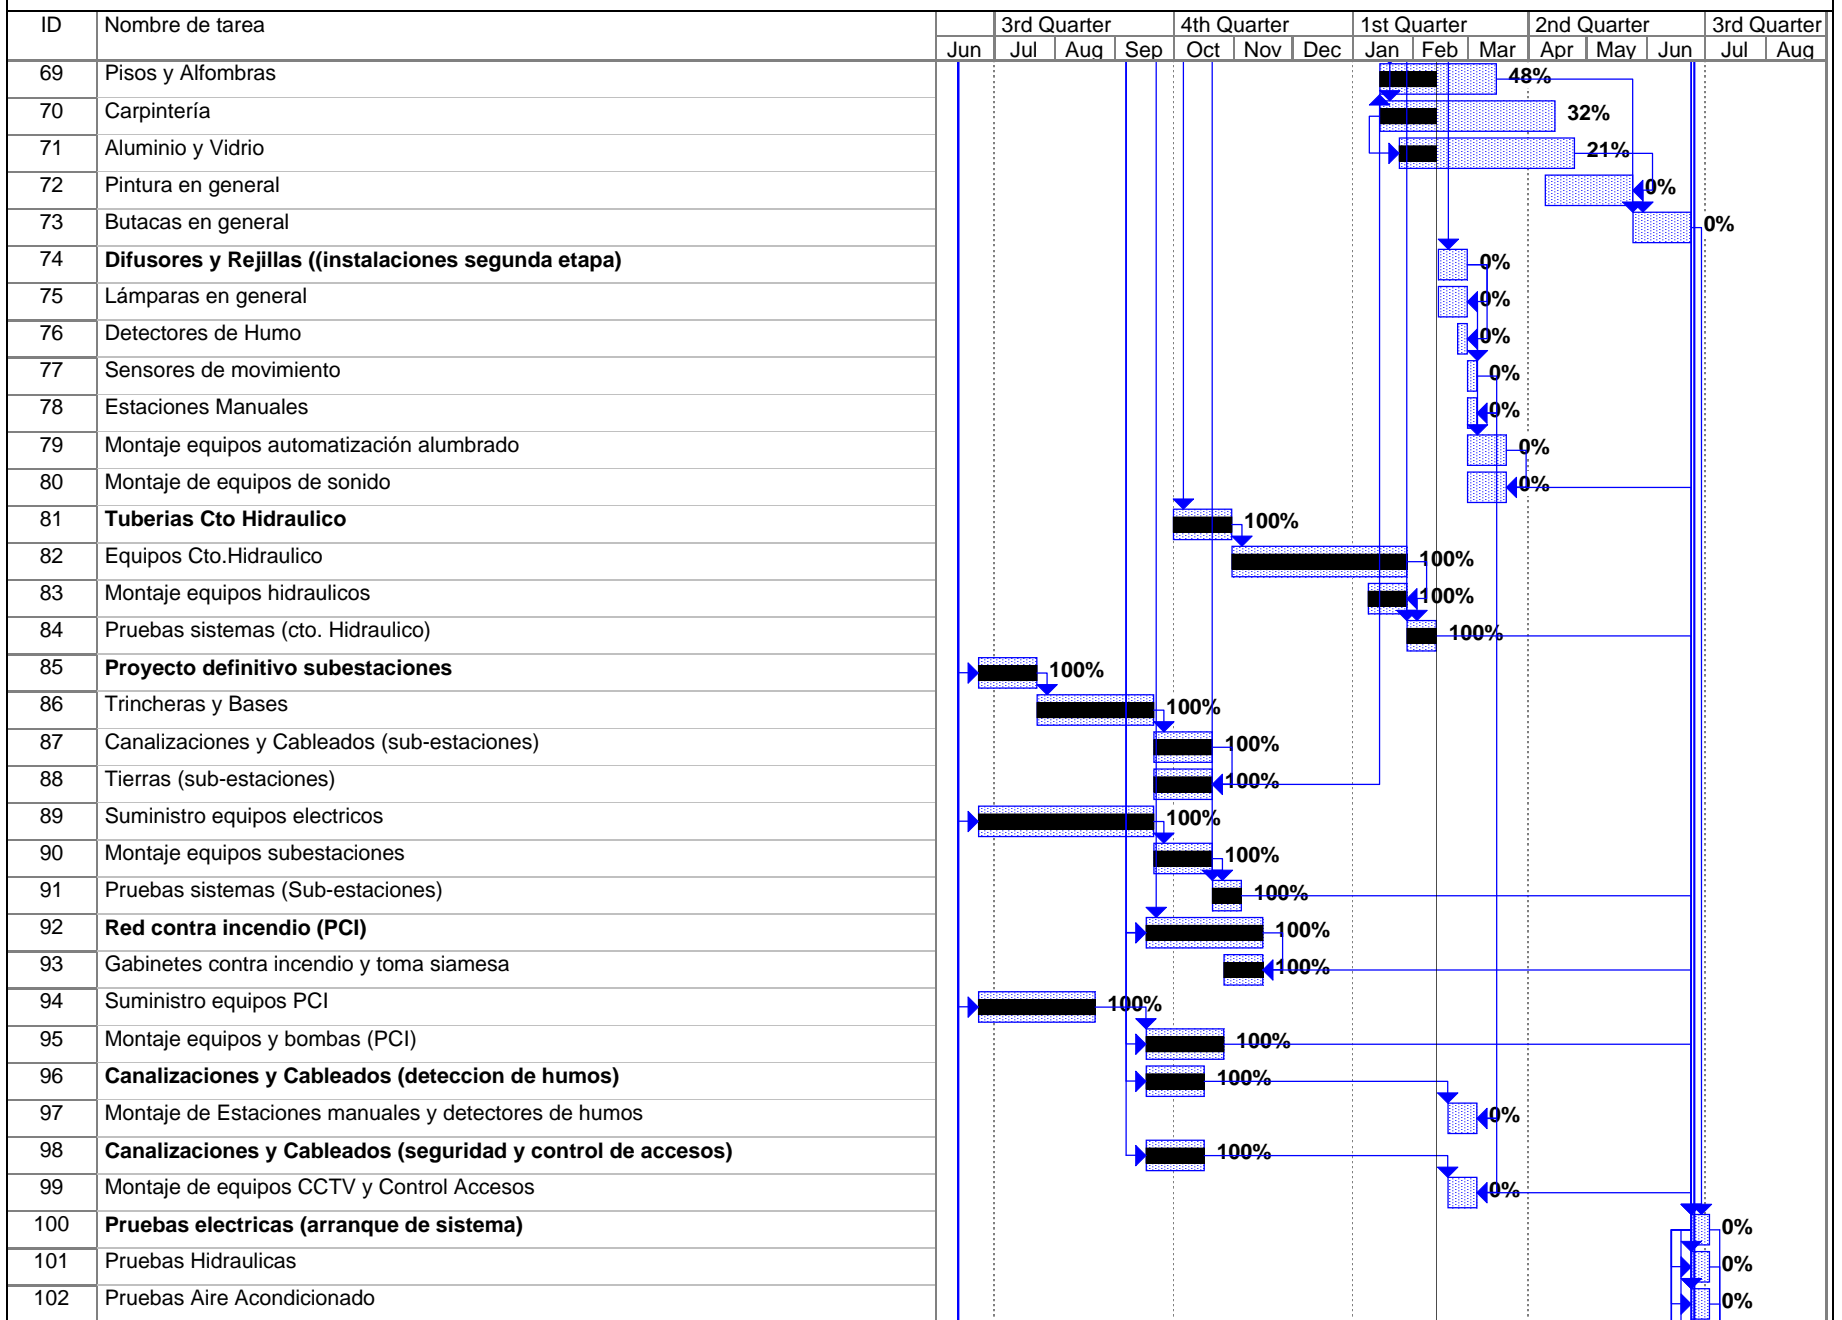

Anexo 10 Avance del Programa corregido al 12 de febrero

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter		
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	
103	Pruebas Sistemas Deteccion Humos															0%	
104	Pruebas Sistemas de CCTV															0%	
105	Pruebas de Automatización Alumbrado y Mecanica Teatral															0%	
106	<b>Proyecto Niveles definitivos estacionamiento</b>																
107	Bardas Colindancia																
108	Terminación terracerías																
109	Trincheras y Registros para Acometidas a Subestaciones																
110	Red de aguas pluviales																
111	Red de aguas residuales																
112	Red de alumbrado exterior																
113	Red Protección contra incendio exterior																
114	Base para pavimento																
115	Pavimentos estacionamiento o Adocreto																
116	Montaje de postes y Cableados																
117	Casetas Seguridad y Vigilancia																
118	<b>Asignar contratista y anticipo (plaza principal acceso)</b>																
119	Terracerias Plaza																
120	Guarniciones																
121	Redes Hidraulicas																
122	Redes Electricas																
123	Pavimentos Plaza																
124	Luminarias Plaza																
125	Fuente Plaza																
126	<b>Asignar contratista y anticipo (teatro al aire libre)</b>																
127	Conformación terracerias																
128	Instalaciones Electricas																
129	Instalaciones Hidraulicas																
130	Red Alumbrado																
131	Gradas y Accesos (teatro aire libre)																
132	Pavimentos (teatro aire libre)																
133	<b>Asignar contrato y anticipo (jardineria)</b>																
134	Conformación terracerias															0%	
135	Siembra Pasto y Plantas															0%	
136	Limpieza en general															0%	

Anexo 10 Avance del Programa corregido al 12 de febrero

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter		
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	
137	<b>Fin</b>																◆ 0%
