


ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	COMPLEJO CULTURAL SIGLO XXI (PRIMERA ETAPA)	[Progress bar: 86%]													
2	Drenajes en Calles Exteriores	[Progress bar: 86%]													
3	Memorias y trámites ante SOAPAP	[Progress bar: 100%]													
4	Convenios con SOAPAP	[Progress bar: 100%]													
5	Obras de DRENAJE POR CALLES (SOAPAP)	[Progress bar: 80%]													
6	Infraestructura eléctrica	[Progress bar: 41%]													
7	Calculo de Carga instalada y Demanda (memoria electrica)	[Progress bar: 100%]													
8	Tramitología CFE	[Progress bar: 100%]													
9	Pagos y Derechos	[Progress bar: 78%]													
10	Obra de Infraestructura	[Progress bar: 0%]													
11	Subestación provicional para obra y pruebas	[Progress bar: 84%]													
12	Obra Civil e Intalaciones Auditorio	[Progress bar: 31%]													
13	Instalación Electrica provicional OBRA (proceso)	[Progress bar: 100%]													
14	Estructura Metálica	[Progress bar: 40%]													
15	Apriete Estructura Metálica	[Progress bar: 0%]													
16	Losa Acero	[Progress bar: 0%]													
17	Concreto Losa Acero	[Progress bar: 0%]													
18	Pretiles azoteas	[Progress bar: 0%]													
19	Bajadas Pluviales preparaciones	[Progress bar: 0%]													
20	Impermeabilización losas,entortados,enladrillados	[Progress bar: 0%]													
21	Asignar contrato y anticipo contratista hidr.y sanit.	[Progress bar: 100%]													
22	Suministros materiales hidraulica y sanitaria	[Progress bar: 100%]													
23	Bajadas pluviales tuberias y coladeras	[Progress bar: 90%]													
24	Instalaciones Sanitarias/piso y registros	[Progress bar: 72%]													
25	Instalaciones Hidraulicas/piso	[Progress bar: 100%]													
26	Contratación y anticipo contratista electricidad	[Progress bar: 100%]													
27	Suministro materiales electricos	[Progress bar: 100%]													
28	Instalaciones Electricas/piso	[Progress bar: 100%]													
29	Firmes pisos en general en FORO y AUDITORIO	[Progress bar: 23%]													
30	Muros Interiores	[Progress bar: 0%]													
31	Instalaciones Electricas/Muro	[Progress bar: 0%]													
32	Instalaciones hidraulicas/Muro	[Progress bar: 0%]													
33	Instalaciones sanitarias /Muro	[Progress bar: 0%]													
34	Aplanados Muros	[Progress bar: 0%]													
35	Recubrimientos Muros	[Progress bar: 0%]													
36	Instalaciones eléctricas por Plafon	[Progress bar: 0%]													

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
37	Instalaciones hidraulicas y sanitarias/plafón														
38	Muros y Albañilería de Fachadas Auditorio														
39	Muros, cadenas y castillos														
40	Preparaciones para precolados														
41	Aplanados muros fachadas														
42	Muro quebrado fachada principal														
43	Azulejo Talavera fachadas														
44	Muros prefabricados fachadas Auditorio														
45	Contratacion y anticipo de empresa														
46	Fabricación precolados														
47	Montaje precolados														
48	Mecánica Teatral (Telemac) Auditorio														
49	Contratación y anticipo														
50	Suministro materiales p/estructura														
51	Fabricacion estructuras p/mecanica teatral														
52	Montaje Estructura Metalica Foro, puentes, contrapesos, poleas etc														
53	Canalizaciones y Cableados														
54	Suministro equipos														
55	Carpinteria Pisos														
56	Aire Acondicionado (Calefacción y Ventilación) Auditorio														
57	Contratación y anticipo de contratista Aire Acondicionado														
58	Compra materiales														
59	Ductos inyección AA														
60	Ductos Retorno AA														
61	Ductos Extracción														
62	Tuberías Agua Helada														
63	Aislamientos en General														
64	Suministro Manejadoras														
65	Suministro Extractores														
66	Suministro Generadores de Agua Helada														
67	Montaje Manejadoras														
68	Montaje extractores														
69	Montaje Generadores Agua Helada														
70	Automatización del Aire Acondicionado														
71	Acabados en General Auditorio														
72	Plafones Acusticos y otros														

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
73	Plafones acabado espejo														
74	Luvers aluminio en plafones														
75	Recubrimientos en muros														
76	Molduras en muros														
77	Pisos y Alfombras														
78	Carpintería														
79	Aluminio y Vidrio														
80	Pintura en general														
81	Butacas en general														
82	Instalaciones Segunda Etapa Auditorio														
83	Difusores y Rejillas														
84	Lámparas en general														
85	Detectores de Humo														
86	Sensores de movimiento														
87	Estaciones Manuales														
88	Montaje equipos automatización alumbrado														
89	Montaje de equipos de sonido														
90	Cuarto Hidraulico Auditorio														
91	Tuberias Cto Hidraulico														
92	Equipos Cto.Hidraulico														
93	Montaje equipos hidraulicos														
94	Pruebas sistemas														
95	Subestaciones Auditorio														
96	Proyecto definitivo subestaciones														
97	Trincheras y Bases														
98	Canalizaciones y Cableados														
99	Tierras														
100	Suministro equipos electricos														
101	Montaje equipos subestaciones														
102	Pruebas sistemas														
103	Protección Contra Incendio (PCI) Auditorio														
104	Red contra incendio														
105	Gabinetes contra incendio y toma siamesa														
106	Suministro equipos PCI														
107	Montaje equipos y bombas														
108	Detección de Humos Auditorio														

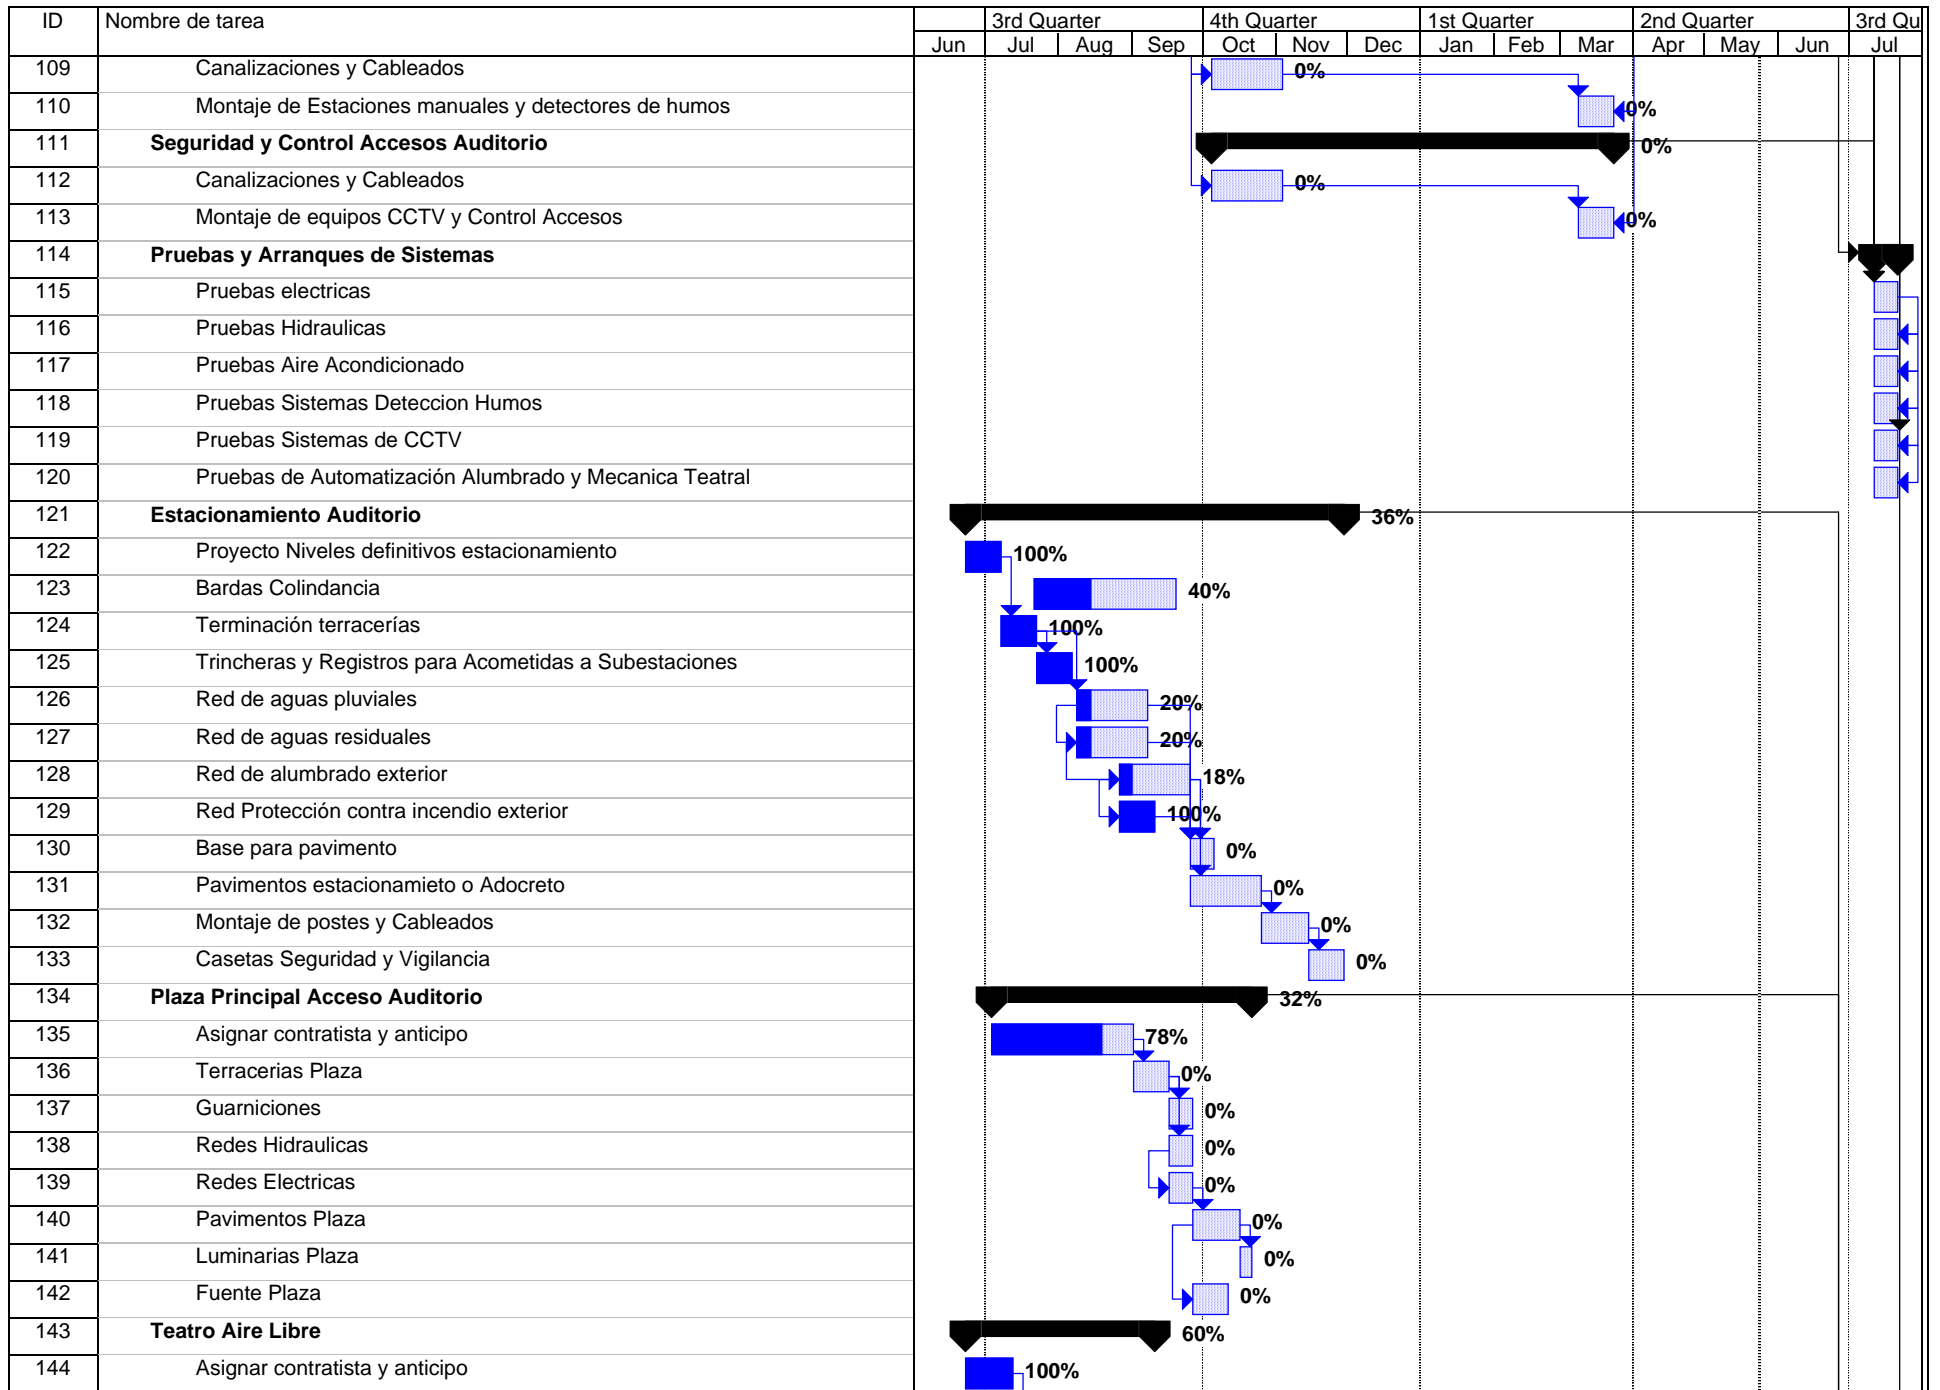

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
145	Conformación terracerias		100%												
146	Instalaciones Electricas		100%												
147	Instalaciones Hidraulicas		100%												
148	Red Alumbrado		30%												
149	Gradas y Accesos														
150	Pavimentos														
151	Jardineria														3
152	Asignar contrato y anticipo		40%												
153	Conformación terracerias														40%
154	Siembra Pasto y Plantas														40%
