



ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Quarter		
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1	<b>COMPLEJO CULTURAL SIGLO XXI (PRIMERA ETAPA)</b>	57														
2	<b>Drenajes en Calles Exteriores</b>	100%														
3	Memorias y trámites ante SOAPAP	100%														
4	Convenios con SOAPAP	100%														
5	Obras de DRENAJE POR CALLES (SOAPAP)	100%														
6	<b>Infraestructura eléctrica</b>	100%														
7	Calculo de Carga instalada y Demanda (memoria electrica)	100%														
8	Tramitología CFE	100%														
9	Pagos y Derechos	100%														
10	Obra de Infraestructura	100%														
11	Subestación provicional para obra y pruebas	100%														
12	<b>Obra Civil e Intalaciones Auditorio</b>	84%														
13	<b>Instalación Electrica provicional OBRA (proceso)</b>	100%														
14	<b>Estructura Metálica</b>	100%														
15	<b>Apriete Estructura Metálica</b>	100%														
16	<b>Losa Acero</b>	100%														
17	<b>Concreto Losa Acero</b>	100%														
18	Pretiles azoteas	100%														
19	Bajadas Pluviales preparaciones	100%														
20	Impermeabilización losas,entortados,enladrillados	100%														
21	Asignar contrato y anticipo contratista hidr.y sanit.	100%														
22	Suministros materiales hidraulica y sanitaria	100%														
23	Bajadas pluviales tuberías y coladeras	100%														
24	Instalaciones Sanitarias/piso y registros	100%														
25	Instalaciones Hidraulicas/piso	100%														
26	Contratación y anticipo contratista electricidad	100%														
27	Suministro materiales electricos	100%														
28	Instalaciones Electricas/piso	100%														
29	<b>Firmes pisos en general en FORO y AUDITORIO</b>	100%														
30	Muros Interiores	100%														
31	Instalaciones Electricas/Muro	62%														
32	Instalaciones hidraulicas/Muro	61%														
33	Instalaciones sanitarias /Muro	60%														
34	Aplanados Muros	30%														
35	Recubrimientos Muros	40%														
36	Instalaciones eléctricas por Plafon	40%														

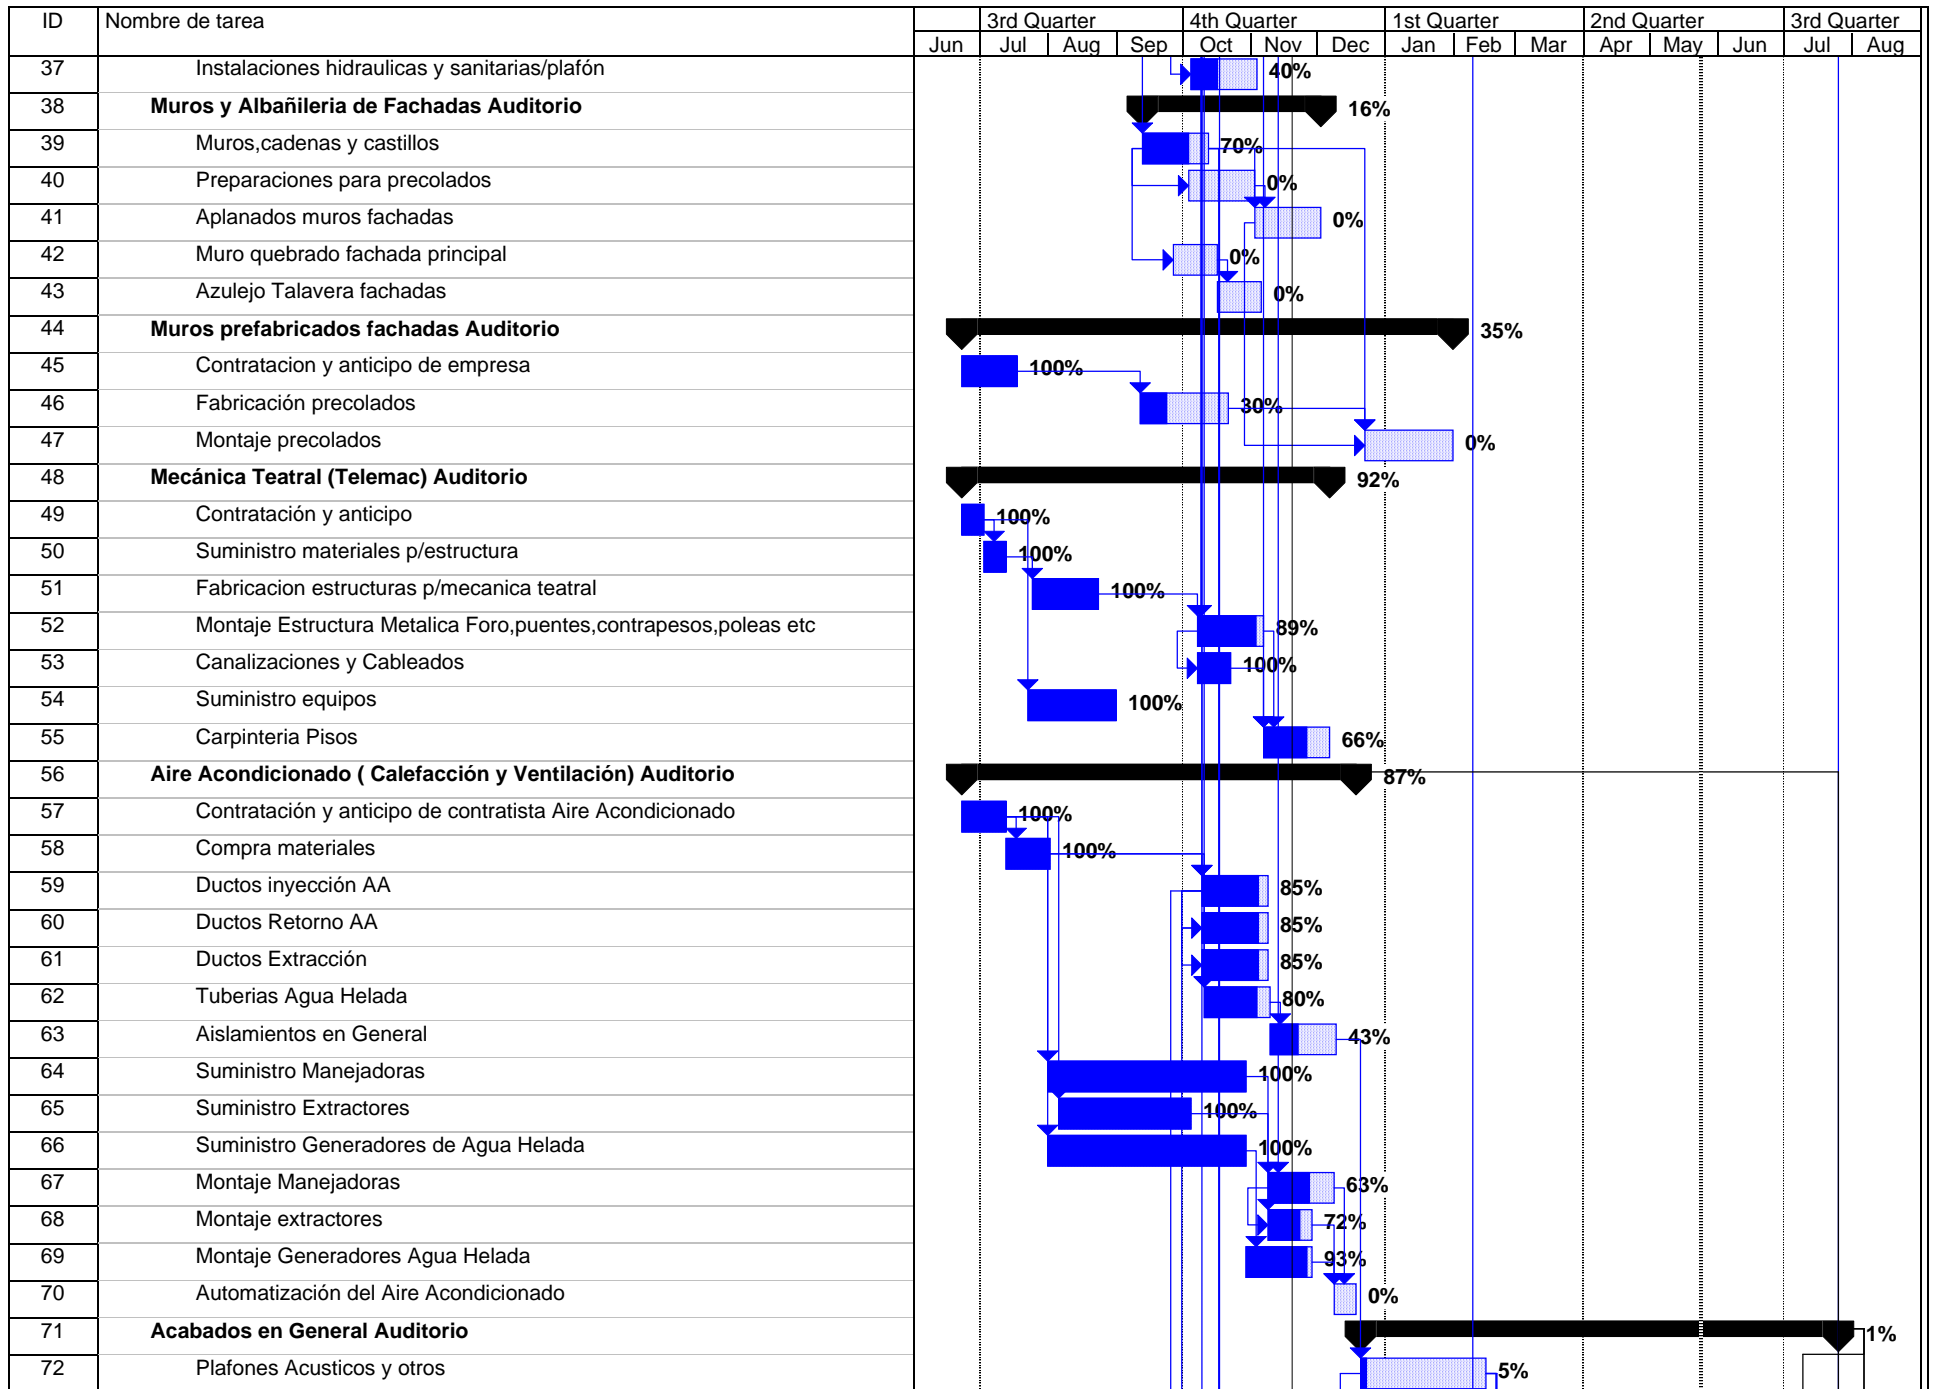

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Quarter		
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
73	Plafones acabado espejo															
74	Luvers aluminio en plafones															
75	Recubrimientos en muros															
76	Molduras en muros															
77	Pisos y Alfombras															
78	Carpintería															
79	Aluminio y Vidrio															
80	Pintura en general															
81	Butacas en general															
82	<b>Instalaciones Segunda Etapa Auditorio</b>															
83	Difusores y Rejillas															
84	Lámparas en general															
85	Detectores de Humo															
86	Sensores de movimiento															
87	Estaciones Manuales															
88	Montaje equipos automatización alumbrado															
89	Montaje de equipos de sonido															
90	<b>Cuarto Hidraulico Auditorio</b>															
91	Tuberias Cto Hidraulico															
92	Equipos Cto.Hidraulico															
93	Montaje equipos hidraulicos															
94	Pruebas sistemas															
95	<b>Subestaciones Auditorio</b>															
96	Proyecto definitivo subestaciones															
97	Trincheras y Bases															
98	Canalizaciones y Cableados															
99	Tierras															
100	Suministro equipos electricos															
101	Montaje equipos subestaciones															
102	Pruebas sistemas															
103	<b>Protección Contra Incendio (PCI) Auditorio</b>															
104	Red contra incendio															
105	Gabinetes contra incendio y toma siamesa															
106	Suministro equipos PCI															
107	Montaje equipos y bombas															
108	<b>Detección de Humos Auditorio</b>															

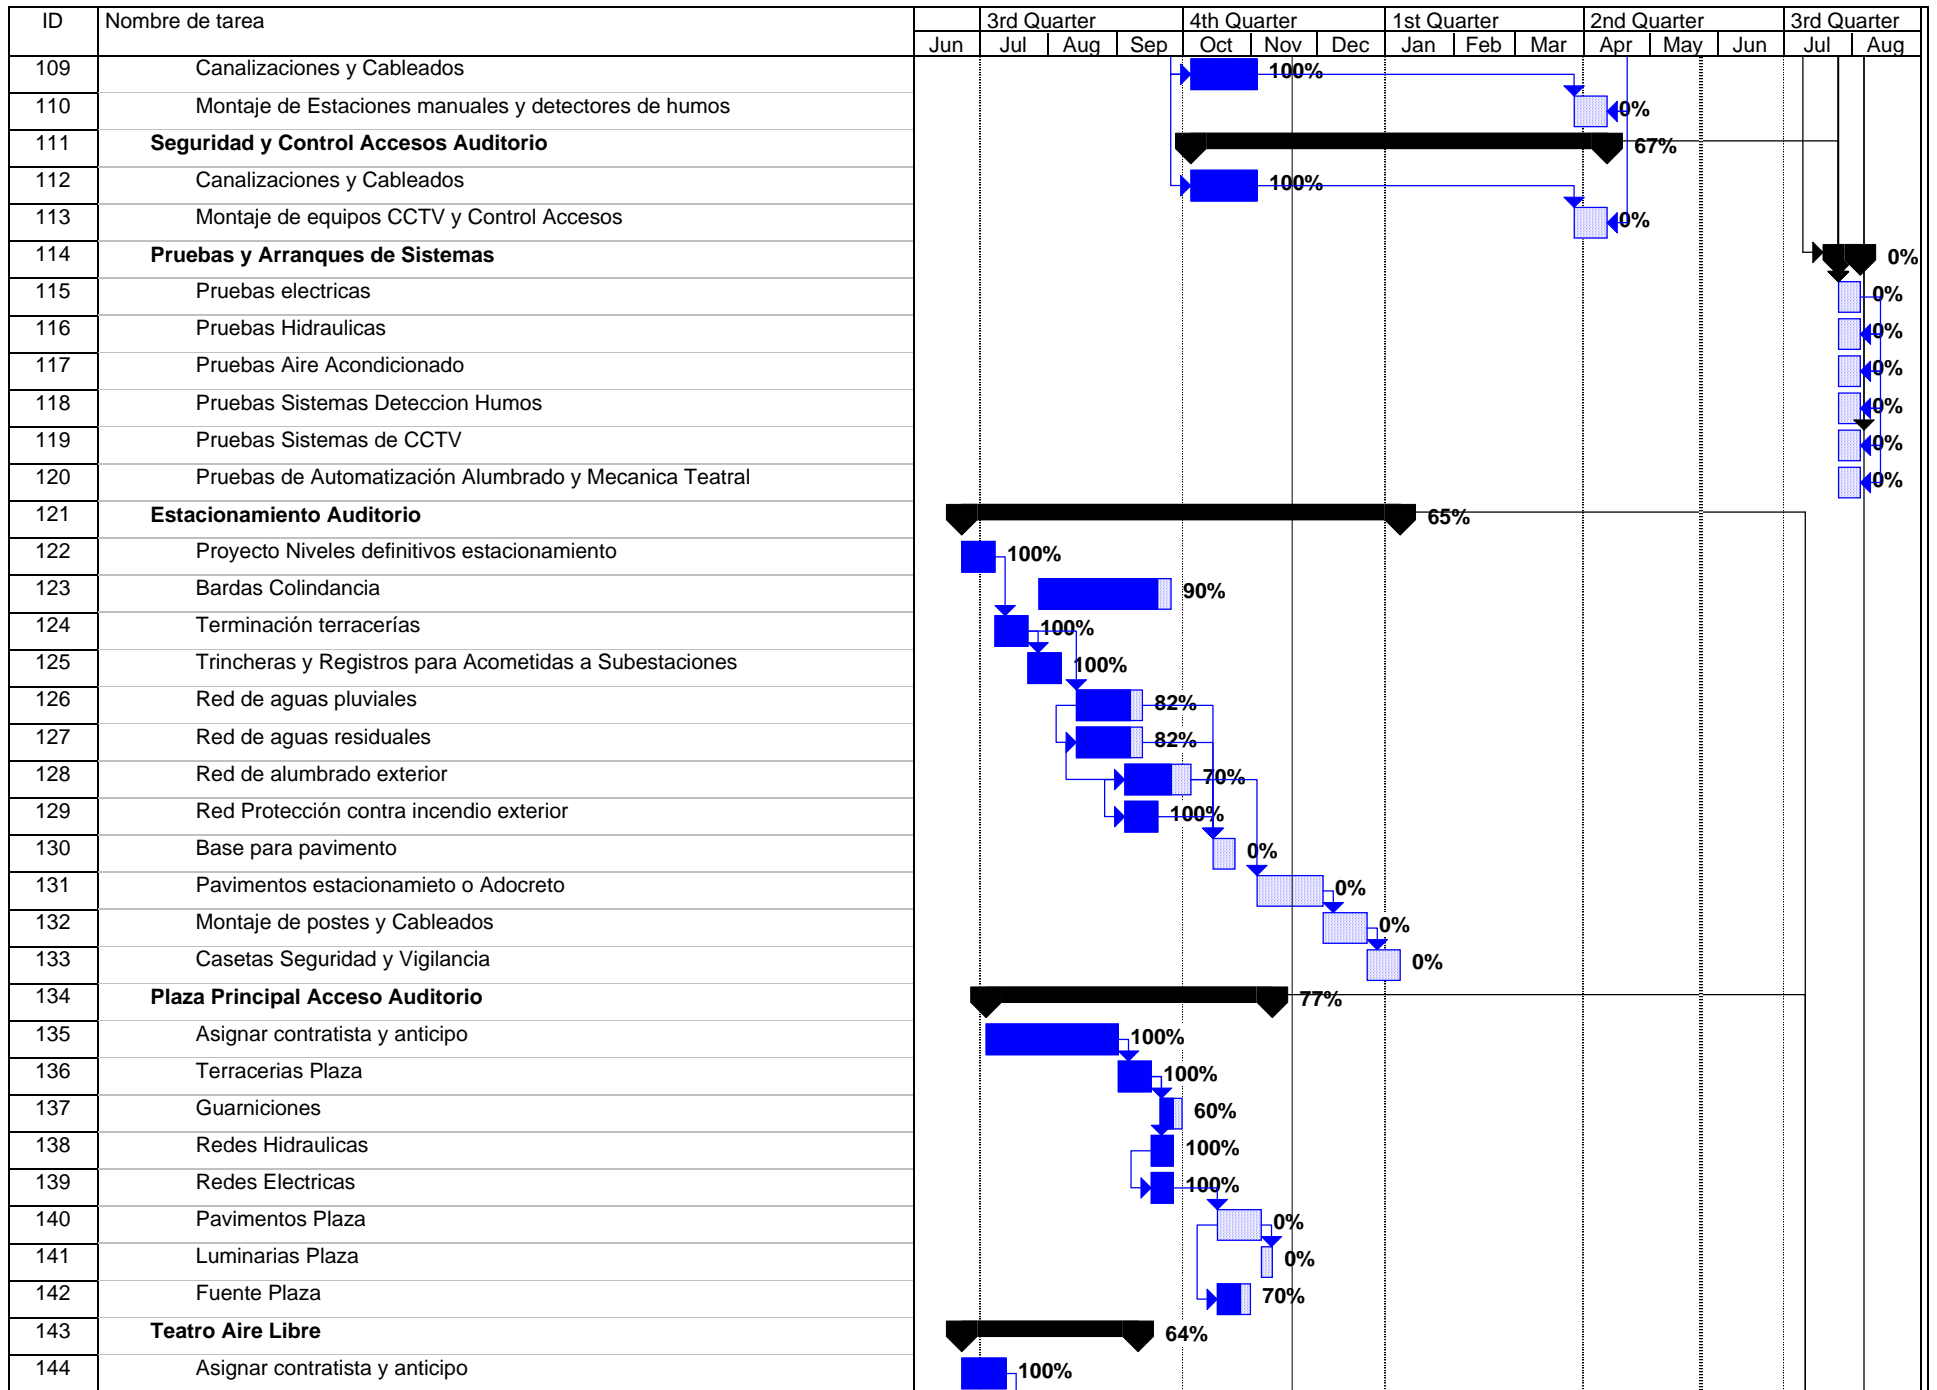

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
145	Conformación terracerias		100%													
146	Instalaciones Electricas		100%													
147	Instalaciones Hidraulicas		100%													
148	Red Alumbrado		76%													
149	Gradas y Accesos		0%													
150	Pavimentos		40%													
151	<b>Jardineria</b>															
152	Asignar contrato y anticipo						40%									
153	Conformación terracerias															0%
154	Siembra Pasto y Plantas															0%
